DOMITIA EXPERTISES

121 Rue de la Source
30000 NIMES
Tél : 04 66 02 92 12
agence@agenda30.fr

MAIRIE DE BOUILLARGUES

Dossier N° 2024-02-0212 #A1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Adresse de l'immeuble :
Salle Communale La Bergerie
2 rue de la République
30230 BOUILLARGUES

Date d'édition du rapport : **06/03/2024**

Opérateur de repérage : **Christophe TOUSSAINT**
Certification n°DTI2844 délivrée jusqu'au 12/07/2029 par Dekra Certification

Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : **Non communiquée**

SOMMAIRE

- **Désignation de l'immeuble** 3
- **Désignation du propriétaire** 3
- **Désignation de l'opérateur de repérage** 3
- **Réalisation de la mission** 3
- **Cadre réglementaire** 3
- **Limites du domaine d'application du repérage** 4
  - Programme de travaux du donneur d'ordre 4
  - Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage 4
- **Conclusion** 5
  - Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante 5
  - Locaux ou parties de locaux non visités 6
  - Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 6
  - Obligation de transmission du rapport 6
- **Dates de visite et d'établissement du rapport** 6
- **Conditions de réalisation du repérage** 6
  - Historique de la mission 6
  - Programme de repérage réglementaire 7
  - Modes opératoires 7
  - Conditions spécifiques du repérage 7
  - Constatations diverses 7
- **Résultats détaillés du repérage** 7
  - Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés 7
  - Locaux visités & matériaux et produits repérés 8
  - Matériaux et produits contenant de l'amiante 13
  - Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante 14
- **Annexes** 21
  - Estimation de la quantité de MPCA repérés 21
  - Rapports précédemment réalisés 21
  - Plans et croquis 22
  - Rapports d'essais de laboratoire 26
  - Planche photographique 48
  - Attestation d'assurance 52
  - Certifications 52
  - Attestation d'indépendance 52

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse :	**Salle Communale La Bergerie** **2 rue de la République** **30230 BOUILLARGUES**
Référence cadastrale :	**AD / 0005**
Lot(s) de copropriété :	**Sans objet**
Nature de l'immeuble :	**Local Commercial ou Bureau**
Étendue de la prestation :	**Parties Privatives**
Destination des locaux :	**Autres bâtiments de culture et de loisirs**
Date du permis de construire :	**1981**

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **MAIRIE DE BOUILLARGUES – Parc municipal BP4 30230 BOUILLARGUES**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage :	**Christophe TOUSSAINT** Certification n°DTI2844 délivrée le 12/07/2022 pour 7 ans par Dekra Certification (5 avenue de Garlande 92220 BAGNEUX) ☒ Avec mention Formation à la prévention des risques liés à l'amiante conformément à l'arrêté du 23 février 2012
Cabinet de diagnostics :	**DOMITIA EXPERTISES** **121 Rue de la Source – 30000 NIMES** N° SIRET : **752 705 244 00032**
Compagnie d'assurance :	**AXA FRANCE IARD** N° de police : **10755853504** Validité : **du 01/01/2024 au 01/01/2025**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier :	**2024-02-0212 #A1**
N° de la version précédente :	**Sans objet**
Ordre de mission du :	**06/02/2024**
Accompagnateur(s) :	**Mr Marc NICOLAS (mairie de Bouillargues)**
Document(s) fourni(s) :	**Aucun**
Moyens mis à disposition :	**Aucun**
Laboratoire(s) d'analyses :	**EUROFINS - OFFRE STANDARD EUROPE – 75, chemin de Sommières – 30310 VERGEZE FRANCE – Accréditation n°1-5922 rév. 4**
Commentaires :	**Néant**

CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition à l'amiante – Repérages avant travaux
- Articles R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail : Évaluation initiale des risques
- Arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Nota : Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE

Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération. Cette obligation vise à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les protections collectives et individuelles de ses travailleurs.

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles bâtis consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations, par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté à la nature de l'opération et à son périmètre, selon le programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre transmet sa mise à jour à l'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées *(Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail)*.

Programme de travaux du donneur d'ordre

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Non communiquée

La liste des travaux est :

Mise en place d'un ascenseur PMR (voir plan) entre le RDC et le 1er

Création d'un sanitaire PMR en RDC dans l'actuel coin cuisine

Percement du mur entre le placard sous-escalier et la salle polyvalente

Reprise des embellissements de la salle Polyvalente

Création d'un sanitaire PMR au 1er étage

Restructuration et redistribution des pièces et sanitaires de l'office

Inspection des toitures de l'office et de la salle « Rabelais »

Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage


Inspection des sol, plinthes murs et plafond de la salle polyvalente (uniquement dans le coin de la salle situé du côté placard sous escalier), placard sous escalier, coin cuisine 1 et de l'ensemble des pièces composant l'appentis (coin cuisine 2, dégagement, les 3 toilettes. Au 1er étage inspection du sol, plinthes et murs de la salle d'activité socio-éducatives uniquement à gauche quand en rentre dans la salle. Inspection des toiture de l'appentis, de la toiture au dessus de la salle polyvalente et de la salle Rabelais. Inspection des mastic de fenêtres de l'appentis (remplacement des fenêtre par rénovation donc avec conservation des cadres existant).

CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de l'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction où il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés figure en Annexe.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Méthode	EC	Photo
N°	DÉSIGNATION				
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités					
74	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	Après analyse		
77	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente	Après analyse		
81	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais	Après analyse		
Parois verticales intérieures					
2	**Plinthes Carrelages**	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	Après analyse		
2	**Plinthes Carrelages**	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	Après analyse		
36	**Plinthes faïence Colle**	La bergerie Rez de chaussée dégagement	Après analyse		
54	**Plinthes faïence Colle faiences**	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	Après analyse		
54	**Plinthes faïence Colle faiences**	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	Après analyse		
68	**Plinthes Carrelages**	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	Après analyse		
68	**Plinthes Carrelages**	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	Après analyse		

Méthode : Après analyse = Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décision de l'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : État d'usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage a l'obligation de conserver et de transmettre ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DA-PP) prévu au I de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le **20/02/2024**

Rapport rédigé à **NIMES**, le **06/03/2024**

Opérateur de repérage : **Christophe TOUSSAINT**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**

Signature de l'opérateur de repérage



Cachet de l'entreprise

DOMITIA EXPERTISES

121 Rue de la Source
30000 NIMES
Tél : 04 66 02 92 12
SIRET : 752 705 244 00032 – APE : 7120B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
06/02/2024	Signature de l'ordre de mission	
20/02/2024	Repérage sur site	Opérateur : Christophe TOUSSAINT
20/02/2024	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
06/03/2024	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2024-02-0212 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : Annexe 1 de de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

Conditions spécifiques du repérage

Nous avons considéré que le remplacement des fenêtre se ferait par rénovation donc avec conservation des cadres existant. Si un remplacement complet des fenêtres devait avoir lieu, des sondages complémentaires devront être réalisés afin de terminer de la présence ou non de joint compriband.

Constatations diverses

Néant

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

- « **Locaux visités & matériaux et produits repérés** » :
  - Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;
  - Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
  - Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
  - Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;
  - Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
    - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
    - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements	⊗	Prélèvement (P1 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
	⊙	Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D1 : référence de la décision opérateur ZPSO : zone présentant des similitudes d'ouvrage (se réfère à un prélèvement ou une décision de l'opérateur sur un matériau ou produit de même nature : ce prélèvement ou cette décision de l'opérateur est l'élément témoin de référence de la ZPSO) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
	a	Présence d'amiante

CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
	!	Prélèvement en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, …, Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	1	Sol Colle carrelage		P12
	1	Sol Colle carrelage		P13
	2	**Plinthes Carrelages**		P14 a
	2	**Plinthes Carrelages**		P15 a
	4	Murs Enduit Papier-Peint		P16
	7	Cimaise bois Colle		P19
	7	Cimaise bois Colle		P20
	16	Murs doublé Enduit Papier-Peint		P17
	16	Murs doublé Enduit Papier-Peint		P18

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	31	Faux plafond Panneaux		D1
	32	Plafond plénum Hourdis béton		D2
	33	Plafond plénum Enduit		P21
	33	Plafond plénum Enduit		P22
La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	24	Sol Chape carrelage		P1
	25	Plinthes faïence Colle		P2
	25	Plinthes faïence Colle		P3
	26	Murs Faïence jaune clair Colle faiences		P4
	26	Murs Faïence jaune clair Colle faiences		P5
	27	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences		P6
	27	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences		P7
	28	Murs Enduit Peinture		P8

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	29	Plafond Enduit Peinture		P9
	29	Plafond Enduit Peinture		P10
	30	Evier Plaque bitumineuse anti-bruit		P11
La bergerie Rez de chaussée Placard sous escalier	34	Murs Enduit Peinture		ZPSO P8
	34	Murs Enduit Peinture		ZPSO P16
La bergerie Rez de chaussée dégagement	35	Sol Chape carrelage		ZPSO P31
	36	**Plinthes faïence Colle**		P23
	37	Murs Enduit Fibre de verre peinte		P24
	37	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P32
	38	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		P25
	38	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P33
	39	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		P27
	40	Murs Faïence Colle faiences		P26
	40	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P28
La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	41	Sol Chape carrelage		ZPSO P31
	43	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P24
	43	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P32
	44	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P25

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	44	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P33
	45	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P26
	45	Murs Faïence Colle faiences		P28
	46	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P27
	46	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P34
	47	Fenêtre Mastic		P29
La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	48	Sol Chape carrelage		P31
	49	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P24
	49	Murs Enduit Fibre de verre peinte		P32
	50	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P25
	50	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		P33
	51	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P28
	51	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P26
	52	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P27
	52	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		P34
	53	Fenêtre Mastic		ZPSO P29
	53	Fenêtres Mastic		P35
	54	**Plinthes faïence Colle faiences**		ZPSO P23
	54	**Plinthes faïence Colle faiences**		P30

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	73	Gaine ventilation Adhésif		P43
La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2	55	Sol Chape carrelage		ZPSO P31
	56	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P24
	56	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P32
	57	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P25
	57	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P33
	58	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P28
	58	Murs Faïence Colle faiences		ZPSO P26
	59	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P27
	59	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P34
La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	61	Sol Chape		P36
	62	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P24
	62	Murs Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P32
	63	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P25
	63	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P33
	64	Murs Faïence Colle faiences		P37
	64	Murs Faïence Colle faiences		P38
	65	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P27
	65	Plafond Enduit Fibre de verre peinte		ZPSO P34
La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	67	Sol Colle carrelage		ZPSO P1
	68	**Plinthes Carrelages**		P39
	68	**Plinthes Carrelages**		P40
	69	Murs Enduit Papier-Peint		ZPSO P16
	70	Murs doublé Enduit Papier-Peint		ZPSO P17
	70	Murs doublé Enduit Papier-Peint		ZPSO P18
	71	Cimaise bois Colle		ZPSO P19
	71	Cimaise bois Colle		ZPSO P20

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
La bergerie Clos & Couvert Clos	72	Murs de façades Enduit		**P41**
	72	Murs de façades Enduit		**P42**
La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	**74**	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**		**P44**
	75	Solin Colle		**P47**
	76	Cheminée Etanchéité bitumineuse		**P45**
	76	Cheminée Etanchéité bitumineuse		**P46**
	85	Solin Plomb		**ZPSO D3**
	88	Tuiles Terre cuite		**ZPSO D4**
La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente	**77**	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**		**ZPSO P44**
	79	Solin Colle		**ZPSO P47**
	80	Solin Plomb		**D3**
	87	Tuiles Terre cuite		**ZPSO D4**
La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais	**81**	**Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment**		**ZPSO P44**
	83	Solin Colle		**ZPSO P47**
	84	Solin Plomb		**ZPSO D3**
	86	Tuiles Terre cuite		**D4**

Matériaux et produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente			P14	ND	
2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente			P15	ND	
36	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée dégagement			P23	ND	
54	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P23	ND	
54	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2			P30	ND	
68	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative			P39	ND	
68	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative			P40	ND	
74	Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuiles")	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis			P44	ND	
77	Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuiles")	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente		X	P44	ND	
81	Plaques ondulées et planes / Plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuiles")	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais		X	P44	ND	

Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Décision			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
31	Faux plafonds / Panneaux et plaques	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	PL		D1		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Décision		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante : daté du 18/04/09					
32	Plafonds / Hourdis	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	PL		D2		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
80	Solin / Plomb	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente			D3		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
84	Solin / Plomb	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais		X	D3		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
85	Solin / Plomb	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis		X	D3		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
86	Toiture / Terre cuite	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais			D4		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
87	Toiture / Terre cuite	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente		X	D4		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					
88	Toiture / Terre cuite	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis		X	D4		
		Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante					

APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
1	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	SO		P12		
1	Revêtements de sols / Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	SO		P13		
4	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	B		P16		
7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	A		P20		
7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	A		P19		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
16	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	G		P17		
16	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	G		P18		
24	Revêtements de sols / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	SO		P1		
25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P3		
25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P2		
26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P5		
26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P4		
27	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P7		
27	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P6		
28	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P8		
29	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	PL		P9		
29	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	PL		P10		
30	Évier / Plaque bitumineuse anti-bruit	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine			P11		
33	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	PL		P22		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
33	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	PL		P21		
34	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Placard sous escalier		X	P16		
34	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Placard sous escalier		X	P8		
35	Plancher / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée dégagement	SO	X	P31		
37	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée dégagement			P24		
37	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée dégagement		X	P32		
38	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée dégagement		X	P33		
38	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée dégagement			P25		
39	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée dégagement	PL		P27		
40	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée dégagement		X	P28		
40	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée dégagement			P26		
41	Plancher / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	SO	X	P31		
43	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1		X	P32		
43	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1		X	P24		
44	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1		X	P25		
44	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1		X	P33		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
45	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1			P28		
45	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1		X	P26		
46	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	PL	X	P27		
46	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	PL	X	P34		
47	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1			P29		
48	Plancher / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	SO		P31		
49	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P24		
49	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2			P32		
50	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2			P33		
50	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P25		
51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P26		
51	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P28		
52	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	PL		P34		
52	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	PL	X	P27		
53	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		X	P29		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
53	Menuiseries extérieures / Joints de mastic de vitrage	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2			P35		
55	Plancher / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2	SO	X	P31		
56	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P24		
56	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P32		
57	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P33		
57	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P25		
58	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P28		
58	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2		X	P26		
59	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2	PL	X	P27		
59	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°2	PL	X	P34		
61	Plancher / Chape carrelage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	SO		P36		
62	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3		X	P32		
62	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3		X	P24		
63	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3		X	P25		
63	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3		X	P33		
64	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3			P37		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement			EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
64	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3			P38		
65	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	PL	X	P27		
65	Plafonds / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	PL	X	P34		
67	Revêtements de sols / Chape carrelage	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	SO	X	P1		
69	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	B	X	P16		
70	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	G	X	P18		
70	Murs et cloisons maçonnés / Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	G	X	P17		
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	A	X	P20		
71	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres / Colle	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	A	X	P19		
72	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	La bergerie Clos & Couvert Clos			P42		
72	Façades lourdes y compris poteaux / Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	La bergerie Clos & Couvert Clos			P41		
73	Ventilation / Adhésif	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2			P43		
75	Éléments associés à la toiture / Colle solin	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis			P47		
76	Éléments associés à la toiture / Étanchéité bitumineuse	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis			P45		
76	Éléments associés à la toiture / Étanchéité bitumineuse	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis			P46		
79	Éléments associés à la toiture / Colle solin	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente		X	P47		
83	Éléments associés à la toiture / Colle solin	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais		X	P47		

ANNEXES

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et prélèvements réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, dans l'unité appropriée (quantité d'œuvre) : ml (mètres linéaires), m² (mètres carrés), u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s'agit pas d'une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque l'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas connaître le ou les processus qui seront mis en œuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d'autant plus que celles-ci ne sont pas encore choisies, ni ce que leur mise en œuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle à l'élaboration d'un devis de désamiantage.

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	EC	Quantité	Commentaire
N°	DÉSIGNATION				
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités					
74	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis		36 m²	
77	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle polyvalente		114 m²	
81	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	La bergerie Clos & Couvert Toiture au dessus salle Rabelais		59 m²	
Parois verticales intérieures					
2	Plinthes Carrelages	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente		45 ml	
36	Plinthes faïence Colle	La bergerie Rez de chaussée dégagement		5 ml	
54	Plinthes faïence Colle faiences	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2		10 ml	
68	Plinthes Carrelages	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative		7 ml	

EC : Cette colonne indique l'état de conservation de chaque matériau ou produit (paramètre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé *EU : État d'usage* *D : Dégradé*

MODALITÉS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination :

- **Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante** : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;
  - Ces déchets peuvent être stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (**ISDND**) : voir Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- **Tous les autres déchets d'amiante**, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
  - Ces déchets doivent être éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (**ISDD**) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des Préfectures, des Conseils départementaux, des Mairies, des DREAL et de l'ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).

Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

- Planche 1/3 : La bergerie - Rez de chaussée
- Planche 2/3 : La bergerie - 1er étage
- Planche 3/3 : La bergerie - Clos & Couvert

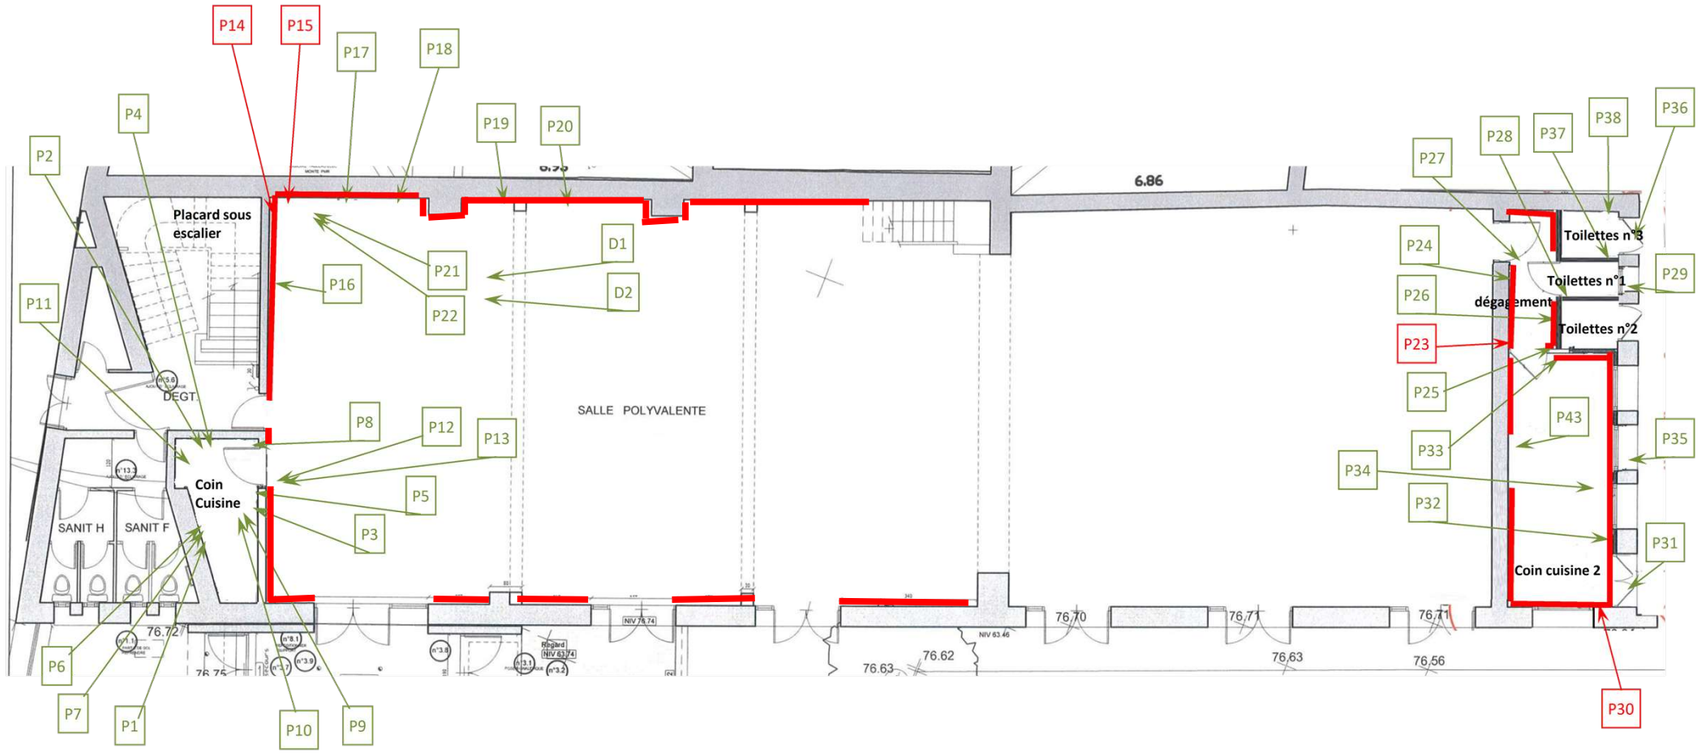


PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2024-02-0212 #A1	*N° planche :* 1/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Salle Communale La Bergerie 2 rue de la République 30230 BOUILLARGUES	
Bâtiment – Niveau : La bergerie - Rez de chaussée	

Document sans échelle remis à titre indicatif


MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
P14	Plinthes Carrelages	Salle polyvalente
P15	Plinthes Carrelages	Salle polyvalente
P23	Plinthes faïence Colle	dégagement
P30	Plinthes faïence Colle faiences	Coin cuisine 2

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
D1	Faux plafond Panneaux	Salle polyvalente
D2	Plafond plénum Hourdis béton	Salle polyvalente
P1	Sol Chape carrelage	Coin Cuisine
P2	Plinthes faïence Colle	Coin Cuisine
P3	Plinthes faïence Colle	Coin Cuisine
P4	Murs Faïence jaune clair Colle faiences	Coin Cuisine
P5	Murs Faïence jaune clair Colle faiences	Coin Cuisine
P6	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	Coin Cuisine
P7	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	Coin Cuisine
P8	Murs Enduit Peinture	Coin Cuisine
P9	Plafond Enduit Peinture	Coin Cuisine
P10	Plafond Enduit Peinture	Coin Cuisine
P11	Evier Plaque bitumineuse anti-bruit	Coin Cuisine
P12	Sol Colle carrelage	Salle polyvalente
P13	Sol Colle carrelage	Salle polyvalente
P16	Murs Enduit Papier-Peint	Salle polyvalente
P17	Murs doublé Enduit Papier-Peint	Salle polyvalente
P18	Murs doublé Enduit Papier-Peint	Salle polyvalente
P19	Cimaise bois Colle	Salle polyvalente
P20	Cimaise bois Colle	Salle polyvalente
P21	Plafond plénum Enduit	Salle polyvalente
P22	Plafond plénum Enduit	Salle polyvalente
P24	Murs Enduit Fibre de verre peinte	dégagement
P25	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	dégagement
P26	Murs Faïence Colle faiences	dégagement
P27	Plafond Enduit Fibre de verre peinte	dégagement
P28	Murs Faïence Colle faiences	Toilettes n°1
P29	Fenêtre Mastic	Toilettes n°1
P31	Sol Chape carrelage	Coin cuisine 2
P32	Murs Enduit Fibre de verre peinte	Coin cuisine 2
P33	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	Coin cuisine 2
P34	Plafond Enduit Fibre de verre peinte	Coin cuisine 2
P35	Fenêtres Mastic	Coin cuisine 2
P36	Sol Chape	Toilettes n°3
P37	Murs Faïence Colle faiences	Toilettes n°3
P38	Murs Faïence Colle faiences	Toilettes n°3
P43	Gaine ventilation Adhésif	Coin cuisine 2

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL	
N° dossier : 2024-02-0212 #A1	*N° planche :* 2/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Salle Communale La Bergerie 2 rue de la République 30230 BOUILLARGUES	
Bâtiment – Niveau : La bergerie - 1er étage	

Document sans échelle remis à titre indicatif

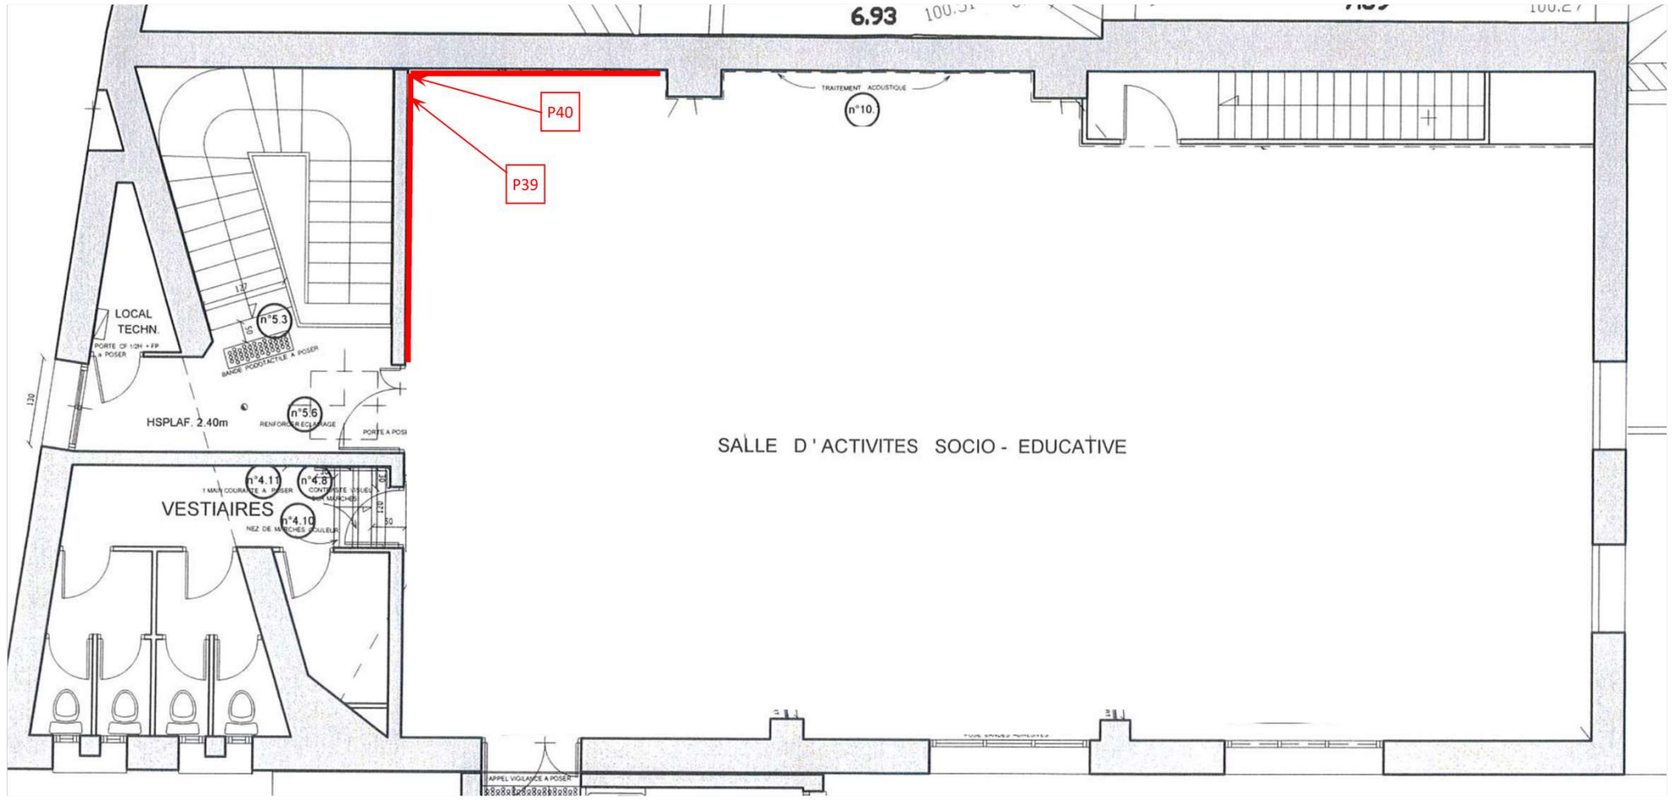


MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
P39	Plinthes Carrelages	Salle d'activités socio-éducative
P40	Plinthes Carrelages	Salle d'activités socio-éducative

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2024-02-0212 #A1	*N° planche :* 3/3
Type : Croquis	*Version :* 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic	
Adresse immeuble : Salle Communale La Bergerie 2 rue de la République 30230 BOUILLARGUES	
Bâtiment – Niveau : La bergerie - Clos & Couvert	

Document sans échelle remis à titre indicatif

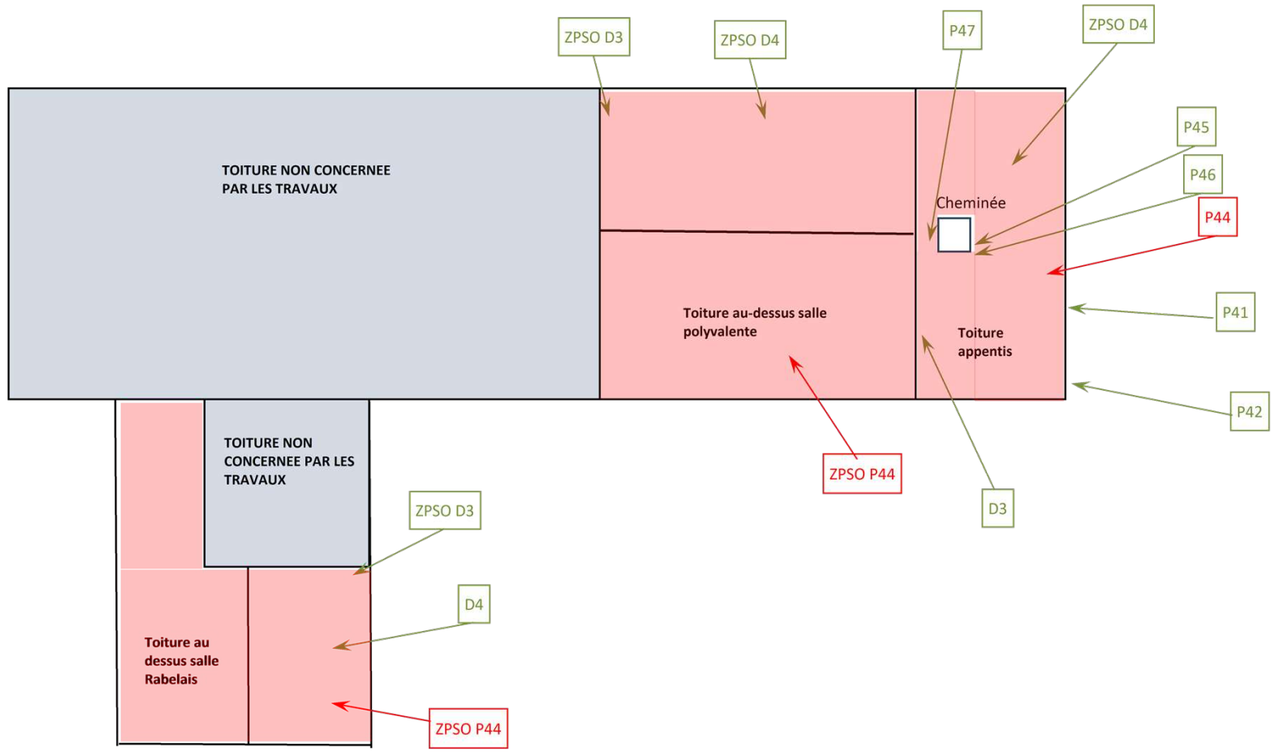

MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
P44	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	Toiture appentis
ZPSO P44	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	Toiture au dessus salle Rabelais
ZPSO P44	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	Toiture au dessus salle polyvalente

MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Réf.	*Désignation*	*Localisation*
D3	Solin Plomb	Toiture au dessus salle polyvalente
D4	Tuiles Terre cuite	Toiture au dessus salle Rabelais
P41	Murs de façades Enduit	Clos
P42	Murs de façades Enduit	Clos
P45	Cheminée Etanchéité bitumineuse	Toiture appentis
P46	Cheminée Etanchéité bitumineuse	Toiture appentis
P47	Solin Colle	Toiture appentis
ZPSO D3	Solin Plomb	Toiture appentis
ZPSO D3	Solin Plomb	Toiture au dessus salle Rabelais
ZPSO D4	Tuiles Terre cuite	Toiture appentis
ZPSO D4	Tuiles Terre cuite	Toiture au dessus salle polyvalente

Local non visité	Investigation approfondie à réaliser

Rapports d'essais de laboratoire


FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	24	Sol Chape carrelage	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P2	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	25	Plinthes faïence Colle	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P3	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	25	Plinthes faïence Colle	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P4	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	26	Murs Faïence jaune clair Colle faiences	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P5	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	26	Murs Faïence jaune clair Colle faiences	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P6	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	27	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P7	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	27	Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P8	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	28	Murs Enduit Peinture	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P9	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	29	Plafond Enduit Peinture	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P10	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	29	Plafond Enduit Peinture	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P11	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin Cuisine	30	Evier Plaque bitumineuse anti-bruit	**Non**	
	Commentaires : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P12	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	1	Sol Colle carrelage	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P13	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	1	Sol Colle carrelage	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P14	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	2	Plinthes Carrelages	**OUI**	
	Commentaires : Néant					
P15	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	2	Plinthes Carrelages	**OUI**	
	Commentaires : Néant					
P16	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	4	Murs Enduit Papier-Peint	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P17	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	16	Murs doublé Enduit Papier-Peint	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P18	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	16	Murs doublé Enduit Papier-Peint	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P19	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	7	Cimaise bois Colle	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P20	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	7	Cimaise bois Colle	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P21	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	33	Plafond plénum Enduit	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P22	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Salle polyvalente	33	Plafond plénum Enduit	**Non**	
	Commentaires : Néant					
P23	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée dégagement	36	Plinthes faïence Colle	**OUI**	
	Commentaires : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P24	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée dégagement	37	Murs Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P25	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée dégagement	38	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P26	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée dégagement	40	Murs Faïence Colle faiences	Non	
	Commentaires : Néant					
P27	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée dégagement	39	Plafond Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P28	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	45	Murs Faïence Colle faiences	Non	
	Commentaires : Néant					
P29	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°1	47	Fenêtre Mastic	Non	
	Commentaires : Néant					
P30	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	54	Plinthes faïence Colle faiences	OUI	
	Commentaires : Néant					
P31	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	48	Sol Chape carrelage	Non	
	Commentaires : Néant					
P32	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	49	Murs Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P33	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	50	Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P34	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	52	Plafond Enduit Fibre de verre peinte	Non	
	Commentaires : Néant					
P35	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	53	Fenêtres Mastic	Non	
	Commentaires : Néant					

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction N°	Élément de construction Désignation	Amianté	Photo
P36	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	61	Sol Chape	Non	
	Commentaires : Néant					
P37	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	64	Murs Faïence Colle faiences	Non	
	Commentaires : Néant					
P38	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Toilettes n°3	64	Murs Faïence Colle faiences	Non	
	Commentaires : Néant					
P39	20/02/2024	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	68	Plinthes Carrelages	OUI	
	Commentaires : Néant					
P40	20/02/2024	La bergerie 1er étage Salle d'activités socio-éducative	68	Plinthes Carrelages	OUI	
	Commentaires : Néant					
P41	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Clos	72	Murs de façades Enduit	Non	
	Commentaires : Néant					
P42	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Clos	72	Murs de façades Enduit	Non	
	Commentaires : Néant					
P43	20/02/2024	La bergerie Rez de chaussée Coin cuisine 2	73	Gaine ventilation Adhésif	Non	
	Commentaires : Néant					
P44	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	74	Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	OUI	
	Commentaires : Néant					
P45	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	76	Cheminée Etanchéité bitumineuse	Non	
	Commentaires : Néant					
P46	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	76	Cheminée Etanchéité bitumineuse	Non	
	Commentaires : Néant					
P47	20/02/2024	La bergerie Clos & Couvert Toiture appentis	75	Solin Colle	Non	
	Commentaires : Néant					

Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse

RAPPORT ANALYSE

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

SARL DOMITIA EXPERTISES
Monsieur Christophe TOUSSAINT
121 Rue de la Source
30000 NIMES

Notre référence : AR-24-KE-009927-01

Numéro de dossier : 24KE004958
Référence de dossier : 20118
2024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24KE004958-001 - Référence *P1 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Sol Chape carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-002 - Référence *P2 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plinthes faïence Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-003 - Référence *P3 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plinthes faïence Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-004 - Référence *P4 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune clair Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-005 - Référence *P5 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune clair Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-006 - Référence *P6 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune foncé Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24KE004958-007 - Référence *P7 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune foncé Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-008 - Référence *P8 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Enduit Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-009 - Référence *P9 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plafond Enduit Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-010 - Référence *P10 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plafond Enduit Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-011 - Référence *P11 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Evier Plaque bitumineuse anti-bruit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-012 - Référence *P12 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Sol Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-013 - Référence *P13 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Sol Colle carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-014 - Référence *P14 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plinthes Carrelages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-015 - Référence *P15 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plinthes Carrelages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-016 - Référence *P16 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs Enduit Papier-Peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-017 - Référence *P17 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs doublé Enduit Papier-Peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24KE004958-018 - Référence *P18 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs doublé Enduit Papier-Peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-019 - Référence *P19 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Cimaise bois Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-020 - Référence *P20 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Cimaise bois Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-021 - Référence *P21 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plafond plénum Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-022 - Référence *P22 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plafond plénum Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-023 - Référence *P23 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Plinthes faïence Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-024 - Référence *P24 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Murs Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-025 - Référence *P25 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Cloisons Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-026 - Référence *P26 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Murs Faïence Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-027 - Référence *P27 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Plafond Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-028 - Référence *P28 La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n°1 \ Murs Faïence Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-029 - Référence *P29 La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n°1 \ Fenêtre Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24KE004958-030 - Référence *P30 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Plinthes faïence Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-031 - Référence *P31 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Sol Chape carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-032 - Référence *P32 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Murs Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-033 - Référence *P33 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Cloisons Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-034 - Référence *P34 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Plafond Enduit Fibre de verre peinte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-035 - Référence *P35 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Fenêtres Mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-036 - Référence *P36 La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n°3 \ Sol Chape*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-037 - Référence *P37 La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n°3 \ Murs Faïence Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-038 - Référence *P38 La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n°3 \ Murs Faïence Colle faiences*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-039 - Référence *P39 La bergerie – 1er étage – Salle socio \ Plinthes Carrelages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-040 - Référence *P40 La bergerie – 1er étage – Salle socio \ Plinthes Carrelages*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-041 - Référence *P41 La bergerie – Clos & Couvert – Clos \ Murs de façades Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

- N° 24KE004958-042 - Référence *P42 La bergerie – Clos & Couvert – Clos \ Murs de façades Enduit*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-043 - Référence *P43 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Gaine ventilation Adhésif*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-044 - Référence *P44 La bergerie – Toiture appentis \ Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-045 - Référence *P45 La bergerie – Toiture appentis \ Cheminée Etanchéité bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-046 - Référence *P46 La bergerie – Toiture appentis \ Cheminée Etanchéité bitumineuse*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24KE004958-047 - Référence *P47 La bergerie – Toiture appentis \ Solin Colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD SAS
Résultats sous-traitance
75 Chemin de Sommières
30130 Vergèze

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page1/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24KE004958-001 - P1 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Sol Chape carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	24KE004958-002 - P2 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plinthes faïence Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (marron)	**MET** / KYJ2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24KE004958-003 - P3 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plinthes faïence Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24KE004958-004 - P4 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune clair Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page2/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24KE004958-005 - P5 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune clair Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24KE004958-006 - P6 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24KE004958-007 - P7 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Faïence jaune foncé Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24KE004958-008 - P8 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Murs Enduit Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24KE004958-009 - P9 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plafond Enduit Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page3/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24KE004958-010 - P1(La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Plafond Enduit Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24KE004958-011 - P11 La bergerie – Rez de chaussée – Coin Cuisine \ Evier Plaque bitumineuse anti-bruit	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24KE004958-012 - P12 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Sol Colle carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24KE004958-013 - P13 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Sol Colle carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2) (3)	24KE004958-014 - P14 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plinthes Carrelages	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	24KE004958-015 - P15 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plinthes Carrelages	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page4/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24KE004958-016 - P1€ La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs Enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24KE004958-017 - P17 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs doublé Enduit Papier-Peint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24KE004958-018 - P1€ La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Murs doublé Enduit Papier-Peint	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page5/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	24KE004958-019 - P1 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Cimaise bois Colle	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24KE004958-020 - P2(La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Cimaise bois Colle	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	**MET** / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24KE004958-021 - P21 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plafond plénum Enduit	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24KE004958-022 - P22 La bergerie – Rez de chaussée – Salle polyvalente \ Plafond plénum Enduit	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24KE004958-023 - P23 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Plinthes faïence Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024	24KE004958-024 - P24 La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Murs Enduit Fibre de verre peinte					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page6/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24KE004958-025 - P2[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (4)	24KE004958-026 - P2[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Murs Faïence Colle faiences	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24KE004958-027 - P2[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – dégagement \ Plafond Enduit Fibre de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page7/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24KE004958-028 - P2E La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n °1 \ Murs Faïence Colle faiences	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces ; matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24KE004958-029 - P2S La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n °1 \ Fenêtre Mastic	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24KE004958-030 - P3(La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Plinthes faïence Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / E7NX	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	24KE004958-031 - P31 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Sol Chape carrelage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / E7NX	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page8/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	24KE004958-032 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Murs Enduit Fibre de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24KE004958-033 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Cloisons Enduit Fibre de verre peinte	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24KE004958-034 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Plafond Enduit Fibre de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (5)	24KE004958-035 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Fenêtres Mastic	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24KE004958-036 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n °3 \ Sol Chape	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24KE004958-037 - P3[illegible] La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n °3 \ Murs Faïence Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page9/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24KE004958-038 - P3E La bergerie – Rez de chaussée – Toilettes n °3 \ Murs Faïence Colle faiences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24KE004958-039 - P3S La bergerie – 1er étage – Salle socio \ Plinthes Carrelages	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / BO2V	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040	24KE004958-040 - P4(La bergerie – 1er étage – Salle socio \ Plinthes Carrelages	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** / F9AF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
041	24KE004958-041 - P41 La bergerie – Clos & Couvert – Clos \ Murs de façades Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (beige)	**MET** / F9AF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24KE004958-042 - P42 La bergerie – Clos & Couvert – Clos \ Murs de façades Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) + (beige)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 — Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 — Page10/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 — Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 — Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24KE004958-043 - P4 La bergerie – Rez de chaussée – Coin cuisine 2 \ Gaine ventilation Adhésif	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) en traces ; matériau souple (fibreux) (collant) (vert) + (beige)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044 (6)	24KE004958-044 - P4 La bergerie – Toiture appentis \ Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (beige)	**MOLP** / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
045 (5)	24KE004958-045 - P4 La bergerie – Toiture appentis \ Cheminée Etanchéité bitumineuse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) en traces	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (5)	24KE004958-046 - P4 La bergerie – Toiture appentis \ Cheminée Etanchéité bitumineuse	Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24KE004958-047 - P4 La bergerie – Toiture appentis \ Solin Colle	Matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	**MET** / ZYS7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 | Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 | Page11/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 | Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 | Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

Observation(s) échantillon(s)

(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La totalité du matériau de type peinture (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) Un matériau semi-dur (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(4) Un matériau dur (orange) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(5) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(6) Un matériau (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-010726-01 | Date d'émission de rapport : 01/03/2024 22:57 | Page12/12
Référence laboratoire N° : 24EK010029 | Référence de suivi du dossier N° : 24KE004958
Reçu au laboratoire le : 26/02/2024 | Date de réception :22/02/2024
Date d'analyse : 29/02/2024
Référence dossier Client:24KE004958 - 201182024-02-0212 - MAIRIE DE BOUILLARGUES - Salle Communale La Bergerie – 30230 BOUILLARGUES

Validé et approuvé par :



Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

Planche photographique



PRLV n° 1 sur Sol Chape carrelage



PRLV n° 2 sur Plinthes faïence Colle



PRLV n° 3 sur Plinthes faïence Colle



PRLV n° 4 sur Murs Faïence jaune clair
Colle faiences



PRLV n° 5 sur Murs Faïence jaune clair
Colle faiences



PRLV n° 6 sur Murs Faïence jaune foncé
Colle faiences



PRLV n° 7 sur Murs Faïence jaune foncé
Colle faiences



PRLV n° 8 sur Murs Enduit Peinture



PRLV n° 9 sur Plafond Enduit Peinture



PRLV n° 10 sur Plafond Enduit Peinture



PRLV n° 11 sur Evier Plaque bitumineuse
anti-bruit



D.O. n° 1 sur Faux plafond Panneaux


PRLV n° 12 sur Sol Colle carrelage


PRLV n° 14 sur Plinthes Carrelages


PRLV n° 15 sur Plinthes Carrelages


PRLV n° 16 sur Murs Enduit Papier-Peint / B


PRLV n° 17 sur Murs doublé Enduit Papier-Peint / G


PRLV n° 19 sur Cimaise bois Colle / A


PRLV n° 21 sur Plafond plénum Enduit


PRLV n° 23 sur Plinthes faïence Colle


PRLV n° 24 sur Murs Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 25 sur Cloisons Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 26 sur Murs Faïence Colle faiences


PRLV n° 27 sur Plafond Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 28 sur Murs Faïence Colle faiences


PRLV n° 29 sur Fenêtre Mastic


PRLV n° 31 sur Sol Chape carrelage


PRLV n° 30 sur Plinthes faïence Colle faiences


PRLV n° 32 sur Murs Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 33 sur Cloisons Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 34 sur Plafond Enduit Fibre de verre peinte


PRLV n° 35 sur Fenêtres Mastic


PRLV n° 36 sur Sol Chape


PRLV n° 37 sur Murs Faïence Colle faiences


PRLV n° 38 sur Murs Faïence Colle faiences


PRLV n° 39 sur Plinthes Carrelages



PRLV n° 41 sur Murs de façades Enduit



PRLV n° 44 sur Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment



PRLV n° 45 sur Cheminée Etanchéité bitumineuse



PRLV n° 47 sur Solin Colle



ZPSO sur PRLV n° 44 sur Plaques sous toiture Plaque fibres-ciment

Attestation d'assurance



RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que : DOMITIA EXPERTISES
Madame Laurence CASSAGNE ET Monsieur Nicolas DEROC
121 rue de la Source
30000 NÎMES

Bénéficie du contrat n° **107558535O4** souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.
Ce contrat a pour objet de :

- **Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 – 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;**
- **Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :**

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
Repérage amiante avant travaux autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)
Diagnostic gestion des déchets (PEMD)
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repérage de plomb avant travaux
Mesures de concentration en plomb dans les poussières
Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes
Etat de l'installation intérieure de gaz
Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Etat parasitaire - Diagnostic Mérules
Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments
Diagnostic de performance énergétique (DPE) projeté
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées
Conseil et Étude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations
Mesurage surface privative (Carrez)
Mesurages surfaces habitable, utile, de plancher - Relevés de surfaces
Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Etat des lieux locatif
Constat logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité
Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations
Installation de détecteurs de fumée
Diagnostic télétravail
Diagnostic de performance numérique
Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel
Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)
Etat des risques et pollutions (ERP)
Constat sécurité piscine
Millièmes de copropriété, tantièmes de charges
Diagnostic Technique Global (DTG) / Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Contrôle de l'installation d'assainissement non collectif
Contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées

Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **1er janvier 2024 au 1er janvier 2025,** sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 19 décembre 2023, **pour la Société AXA**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

Certifications



CERTIFICAT
DE COMPETENCES

DEKRA

Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

Christophe TOUSSAINT

est titulaire du certificat de compétences N°**DTI2844** pour :

Constat de risque d'exposition au plomb du 12/07/2022 au 11/07/2029
Diagnostic amiante sans mention du 12/07/2022 au 11/07/2029
Diagnostic amiante avec mention du 12/07/2022 au 11/07/2029
Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 01/08/2022 au 31/07/2029
Diagnostic de performance énergétique du 01/08/2022 au 31/07/2029
Etat de l'installation intérieure de gaz du 07/11/2022 au 06/11/2029
Etat de l'installation intérieure d'électricité du 24/09/2020 au 23/09/2027

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification.
Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 16/11/2022

Diagnostiqueur immobilier certifié DEKRA

cofrac
Accréditation n° 4-0081
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide.

DEKRA Certification SAS – www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière – Porte 1 – Rue de la Boursidière – 92350 Le Plessis-Robinson – France

Attestation d'indépendance

« Je soussigné Nicolas DEROC, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

AGENDA DIAGNOSTICS
Domitia Expertises SARL
121 rue de la source
30.000 NIMES
SARL au Capital de 15 000 €
Siret 752 705 264 00029 – APE 7120B
N°TVA FR 75 705 264
